
Опросный лист на Транзисторные ЗВУ серии ЗВУ-ELT

Очистить форму

Заказчик	
Объект	
Количество	
Проектная организация	

Типовая структурная схема

- ◉ №1
- ○ №2
- ○ №3
- ○ №4
- ○ №5
- ○ №6
- ○ №7
- ○ №8
- ○ №9
- ○ №10
- ○ №11
- ○ №12
- ○ №13
- ○ №14
- ○ №15
- ○ №16
- ○ №17
- ○ №18
- ○ №19
- ○ №20

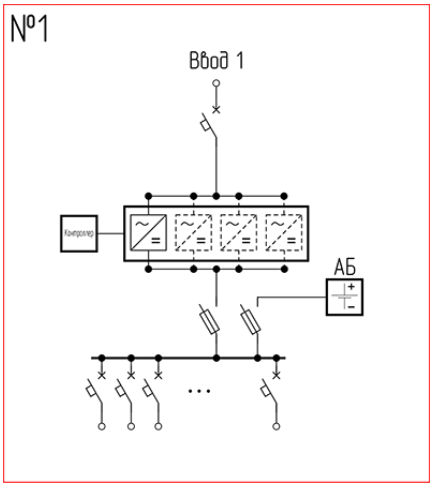

Характеристики

Входные	
Количество вводов	
Входное напряжение	
Система заземления	
Выходные	
Выходной ток зарядного устройства	
Выходное напряжение	
Количество зарядных модулей	
Система охлаждения модуля ЗУ	
Выходной ток одного модуля	
Механические	
Исполнение корпуса	
Габаритные размеры ШхГхВ	800x800x2100
Ввод/Вывод кабеля	

Отходящие линии

Производитель коммутационных аппаратов		Секция №1 Тип	Род тока	Ном. ток, А	Хар-ка	Кол-во, шт.	Секция №2 Тип	Род тока	Ном. ток, А	Хар-ка	Кол-во, шт.
Выключатели											
Разъединители	OEZ										
Контакторы											
		Групповые аппараты					Аппарат защиты АБ				
								Постоянный			

☐ АКБ в отдельном шкафу

Параметры АБ

Производитель	Серия	Емкость, Ач	Напряжение батареи, В 12	Тип подключения Универсальное
Модель	Масса, кг	Технология	Количество АКБ в шкафу, шт	Срок службы, лет

Опции

☐ 1. Контр. изоляции на шинах	☐ 12. Шинка мигающего света	☐ 23. Обмен данными ModBus (RS485)
☐ 2. Пофидерный контроль изоляции (автоматический)	☐ 13. Термокомпенсация напряжения подзаряда	☐ 24. Обмен данными МЭК 61850 (Ethernet)
☐ 3. Пофидерный контроль изоляции (ручной)	☐ 14. Защита АБ от глубокого разряда	☐ 25. Измерительный преобразователь 4-20 мА
☐ 4. Обогрев шкафа	☐ 15. Поэлементный контроль параметров АБ	☐ 26. Межсекционный разъединитель
☐ 5. Блок аварийного освещения (БАО)	☐ 16. Организация питания цепей оперативных блокировок	☐ 27. Освещение шкафа
☐ 6. АВР 2 входа, 1 выход	☐ 17. ОПН на шинах переменного тока	☐ 28. Инвертор на выходе
☐ 7. АВР 2 входа, 2 выхода	☐ 18. ОПН на шинах постоянного тока	☐ 29. Сенсорная ЖК панель оператора 7" с мнемосхемой
☐ 8. Сигнализация положения коммутационных аппаратов	☐ 19. Сейсмостойкость 9 баллов	Дополнительные требования:
☐ 9. Общая сигнализация аварийного отключения коммутационных аппаратов	☐ 20. Цоколь шкафа	
☐ 10. Стрелочные измерительные приборы	☐ 21. Принудительная вентиляция	
☐ 11. Цифровые измерительные приборы	☐ 22. IP 54	

Поставщик:

Подпись _____ Расшифровка подписи _____

МП

Заказчик:

Подпись _____ Расшифровка подписи _____

МП
